

# LĪGUMS LVC2016/2.1.1/53/AC/PA

Rīgā 2016. gada 31. augustā

Līguma reģistrācijas numurs 376

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **ceļu būves firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Binders”** valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas personā un valdes locekļa Ingusa Pēterona personā, kuri darbojas pamatojoties uz 2016.gada 11.augusta ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta kārtībā veiktā iepirkuma "*Valsts reģionālā autoceļa P64 Višķi – Nīcgale posma km 5,21 – 7,00 seguma atjaunošana*" (identifikācijas Nr. LVC2016/129/AC) komisijas 2016.gada 25. augusta lēmumu noslēdz šādu būvdarbu līgumu:

## 1. Definīcijas

- 1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.4. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.5. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību.
- 1.6. Būvuzraugs ir Būvinženiera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” vai citiem, šos noteikumus aizstājošajiem, līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 1.7. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 1.8. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
- 1.9. Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums ir Pasūtītāja apstiprināts visu projektā paredzēto būvdarbu ziemas sezonas pārtraukums būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.

## 2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **valsts reģionālā autoceļa P64 Višķi – Nīcgale posma km 5,21 – 7,00 seguma atjaunošanu** (turpmāk tekstā – Darbs) līgumā noteiktajā laikā.
- 2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
  - 2.2.1. Šis līgums.

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 2.2.2. Līguma dati                   | 1. pielikums. |
| 2.2.3. Iepirkuma sarakste            | 2. pielikums. |
| 2.2.4. Specifikācijas                | 3. pielikums. |
| 2.2.5. Rasējumi/Defektu akti         | 4. pielikums. |
| 2.2.6. Darbu daudzumu saraksts       | 5. pielikums. |
| 2.2.7. Būvdarbu garantijas noteikumi | 6. pielikums. |
| 2.2.8. Finanšu garantiju noteikumi   | 7. pielikums. |
| 2.2.9. Piedāvājums                   | 8. Pielikums. |
| 2.2.10. Prasības personāla pieredzei | 9.pielikums.  |
- 2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 3. pielikumā „Specifikācijas” (turpmāk tekstā – Specifikācijas) nav noteikts citādi.

### 3. Darba izmaiņas

- 3.1. Šis ir vienības cenu līgums - Darbu daudzumu sarakstā norādītie darbu daudzumi ir aptuveni un atbilstoši būvprojektam veicamā darba faktiskais apjoms var atšķirties no Darbu daudzumu sarakstā paredzētā, tomēr faktiski paveiktais apjoms, ieskaitot saskaņā ar līguma 3.2. punktu uzdotās izmaiņas, nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 5 (pieciem) %.
- 3.2. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu būves atbilstību būvprojekta mērķim, Pasūtītājs drīkst izmainīt būvprojektu un noteikt ar būvprojekta izmaiņām saistītu Darba pabeigšanas termiņa grozījumus:
- 3.2.1. par būvprojekta izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos;
- 3.2.2. būvprojekta izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru „Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos;
- 3.2.3. būvprojekta izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
- 3.2.3.1. izmaiņas nedrīkst kāda Darbu daudzumu sarakstā sākotnēji paredzēta darba apjomu mainīt vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas,
- 3.2.3.2. izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu daudzumu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas,
- 3.2.3.3. izmaiņām nepieciešamais kopējais Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 dienas,
- 3.2.3.4. kopējās būvprojekta izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 4,5 (četriem komats pieciem)%,
- 3.2.3.5. izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam. Izmaiņu akts ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
- 3.3. Par darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

### 4. Līgumcena

- 4.1. Līgumcena ir **92 973,00 EUR** (deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **19 524,33 EUR** (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit četri *euro* un 33 centi). Līgumcenas un

pievienotās vērtības nodokļa summa ir **112 497,33 EUR** (viens simts divpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi *euro* un 33 centi).

- 4.2. Līgumcena ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

## **5. Darba izpildes laiks**

- 5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1. pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā.
- 5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3. sadaļas prasībām.
- 5.3. Sākot no 1.pielikumā „Līguma dati” minētā laika, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām.
- 5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
  - 5.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai pēc līguma 5.3. punktā minētā laika;
  - 5.4.2. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
  - 5.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

## **6. Būvdarbu garantija**

- 6.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 6.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3(trīs) gadi, izņemot līguma 6.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 6.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākas no Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 4. pielikumā noteiktā Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 6.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 13.7.punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

## **7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana**

- 7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
- 7.2. Atbilstoši līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajai vasaras un ziemas uzturēšanas klasei un Specifikācijās norādītajam apjomam, Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim,

kamēr būvlaukums ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam.

- 7.3. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ. Tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami par autoceļa īpašnieka līdzekļiem. Lai ziemas uzturēšanas periodu nodotu autoceļu vai tā posmu Pasūtītājam, Izpildītājam jāievēro šādi nosacījumi:
  - 7.3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi;
  - 7.3.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu.
- 7.4. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:
  - 7.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;
  - 7.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

## **8. Darba programma un Darba vadības apspriedes**

- 8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
- 8.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 8.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvinženieris, Būvuzraugs un Projekta vadītājs. Būvinženieris vada Darba vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
- 8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas un citus jautājumus.

## **9. Sadarbība**

- 9.1. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
- 9.2. Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī līguma izpildi.
- 9.3. Izpildītājs brīdina Būvinženieri un Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.4. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba izpildes termiņa grozījumiem vai Darba izmaiņām, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var

- ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.5. Izpildītājs, saskaņojot ar Būvinženieri, uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 9.6. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
- 9.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
  - 9.6.2. nekompetence vai nolaidība;
  - 9.6.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
  - 9.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 9.7. Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
- 9.8. Projekta vadītājam, Būvinženierim un/vai Būvuzraugam, Pasūtītāja Autoceļu kompetences centra pārstāvjiem, kā arī citiem Pasūtītāja pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties būvlaukumā, jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Par ierašanos būvlaukumā un ražotnē (ražošanas procesa laikā) iepriekš nav jābrīdina. Pārējos gadījumos jābrīdina vismaz sešas stundas iepriekš, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (telefons, internets, fakss). Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 9.9. Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 9.10. Izpildītājs nodrošina, ka asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
- 9.11. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo un darbu izpildē lieto būvdarbu žurnālu atbilstoši Pasūtītāja noteiktām vadlīnijām un izstrādātām veidlapām (<http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/> → Iepirkumi un dokumentācija → Veidlapas → Būvdarbu izpildītājiem).

## **10. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaīņa**

- 10.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus.
- 10.2. Izpildītājs nodrošina, ka Būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos Būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Būvinženiera, Projekta vadītāja, Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
- 10.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, vai nomaīņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaīņas jāiesniedz Projekta vadītājam Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaīnai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.

- 10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 9.6. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
- 10.5. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas.
- 10.6. Izpildītājam jāinformē Būvinženieri par līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
- 10.7. Piedāvājumā norādītā asfaltbetona ražotāja maiņa ir atļauta tikai ar Projekta vadītāja apstiprinātu Būvinženiera lēmumu, ja tas ir līdzvērtīgs vai labāks par Specifikācijās noteiktajām prasībām. Asfaltbetona ražotāja maiņas ierosinājums jāiesniedz, piemērojot līguma 10.3. punktā noteikto kārtību un termiņus, bet lēmumu par tā nomaiņu vai atteikumu paziņo, piemērojot līguma 10.5. punktā noteikto kārtību un termiņus.

## **11. Kvalitāte un pārbaudes**

- 11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.
- 11.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.4. punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 11.3. Pēc Būvinženiera un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 11.4. Pasūtītājs pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.
- 11.5. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Būvinženiera noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja puses vienojas, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 11.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru Puses savstarpēji rakstveidā vienojas 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās Puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā norādītajā termiņā Puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu Puses uzskatīs sev par saistošu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītās izmaksas Puses sedz vienādās daļās.

## **12. Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā**

- 12.1. Paveiktā Darba pieņemšanu un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, atbilstoši iepriekš minēto būvnoteikumu 52. punkta prasībām.

## **13. Maksājumu kārtība un dokumenti**

- 13.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina:

- 13.1.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par atbilstoši būvprojektam faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;
- 13.1.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
- 13.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 1. pielikumā „Līguma dati” norādītajā apmērā no līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 7.pielikuma „Finanšu garantiju noteikumi” prasībām. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. Avansu jāatmaksā ne vēlāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām.
- 13.3. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 13.4. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja datorprogrammā BUVIS ([www.lvceli.lv/buvis](http://www.lvceli.lv/buvis)). Būvinženieris pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
- 13.5. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

<b>Maksātājs</b>	<b>LR Satiksmes ministrija</b>
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 13.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas. Pēdējā aktā par izpildīto Darba daļu Izpildītājs drīkst veikt atlikušo un iztrūkstošo darbu apjomu ieslēgšanu un/vai izslēgšanu, lai līguma kopējā atlikušo darbu bilance pēc būvdarbu pabeigšanas būtu „0”.
- 13.7. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto ieturējuma naudu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (tas ir, bez PVN), turpmāk – Ieturējuma nauda. Puses piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
- 13.7.1. 50 (piecdesmit) % no Ieturējuma naudas Izpildītājs saņem pēc Gala novērtējuma akta (*Pasūtītāja apstiprināta veidlapa*) parakstīšanas;
- 13.7.2. 50 (piecdesmit) % Ieturējuma naudas Izpildītājs saņem pēc līguma 6. nodaļā „Būvdarbu garantija” un 6. pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktā maksimālā garantijas termiņa beigām, izņemot nākamajā apakšpunktā noteikto gadījumu;
- 13.7.3. iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu Izpildītājam ar Pasūtītāju vienojoties ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju. Šādā

gadījumā Pasūtītājs iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu pilnā apmērā pārskaita Izpildītājam.

- 13.8. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 13.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
- 13.10. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā, līgumsodus puses veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot līguma 13.7. punktā noteikto Ieturējuma naudu līdz garantijas termiņa beigām.

#### **14. Apdrošināšana un darba aizsardzība**

- 14.1. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 14.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un nodrošina tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba sākšanas.
- 14.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā.

#### **15. Līguma izpildes spējas garantija**

- 15.1. Izpildītājam nav jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija.

#### **16. Līgumsods**

- 16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
- 16.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra - līguma 4.1.punktā noteiktās objekta līgumcenas.
- 16.3. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.
- 16.4. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 (divi simti)



- euro* apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.
- 16.5. Par Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neizpildīšanu, noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.
- 16.6. Izbeidzot šī līguma darbību vai atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas (atkāpšanās) iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas.
- 16.7. Ja līguma 10.3. un 10.4. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņas ierosinājumu par konkursa piedāvājumā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru gadījumu.
- 16.8. Ja līguma 10.7.punktā noteiktajā kārtībā Izpildītājs neiesniedz ierosinājumu asfaltbetona ražotāja maiņai ar līdzvērtīgu savā piedāvājumā norādītajam, kurš atbilst iepirkuma dokumentācijā un Specifikācijās izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.

## **17. Līguma grozīšana**

- 17.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgātās vienības cenas.
- 17.2. Ja iestājas kāds no līguma 5.4. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.
- 17.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta noteikumi.

## **18. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana**

- 18.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
- 18.1.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
- 18.1.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
- 18.1.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
- 18.1.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
- 18.1.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
- 18.1.6. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

- 18.1.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
- 18.1.8. Izpildītājs līguma 14. punktā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar līguma 14.3. punkta noteikumiem.
- 18.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
- 18.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
- 18.2.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
- 18.2.3. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu.
- 18.3. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
- 18.4. Atkāpšanās no līguma vai līguma izbeigšanas gadījumā:
- 18.4.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
- 18.4.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.1. punkta noteikumus;
- 18.4.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
- 18.4.4. pēc visu darbu pabeigšanu puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
- 18.4.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus līguma 18.4.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
- 18.4.6. ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 16.6. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 18.4.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
- 18.4.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 18.5. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 18.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

## 19. Nepārvarama vara

- 19.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to

piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.

19.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:

19.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

19.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

19.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;

19.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai aprūtinošu, bet neiespējamu.

19.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

## 20. Citi noteikumi

20.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

20.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 11 (vienpadsmit) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti 9 (deviņi) pielikumi.


## 21. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	CBF SIA “Binders”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003164644
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1050	Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073

Pušu paraksti:

Pasūtītājs  
VAS “Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs  
J.Lange

valdes loceklis  
E.Strods

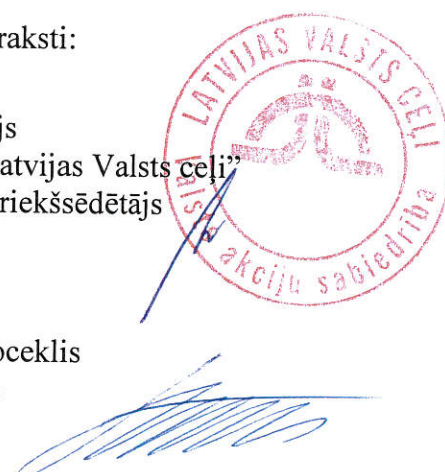

Izpildītājs  
CBF SIA “Binders”  
valdes priekšsēdētājs  
A.Sēja


valdes loceklis  
I.Pētersons



Objekta nosaukums	Būvdarbu izpildes termiņš		Būvlaukuma pieejamība	Uzturēšanas klase	Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība		
	Uzsākšanas datums	Darba izpildes laiks			Avanss	Maksājumu termiņš	Ieturējuma nauda
1.	līguma 5.1.punkts	līguma 5.2.punkts	līguma 5.3.punkts	līguma 7.2.punkts	līguma 13.2.punkts	līguma 13.3.punkts	līguma 13.7.punkts
	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
Valsts reģionālā autoceļa P64 Višķi – Nēgale posma km 5,21 – 7,00 seguma atjaunošana	21 dienas laikā pēc līguma noslēgšanas	30 dienas	Sākot ar piecpadsmito dienu pēc līguma noslēgšanas	C	Ne vairāk kā 20% no līgumcenas	30 dienas	10%


Pasūtītājs  
VAS "Latvijas Valsts ceļi"  
valdes priekšsēdētājs  
J.Lange

valdes loceklis  
E.Strods



Izpildītājs  
CBF SIA "Binders"  
valdes priekšsēdētājs  
A.Sēja

valdes loceklis  
I.Petersons



Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

### 1. **Avansa garantijai**

1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.

### 1.2. **Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:**

1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

### 2. **Garantijas laika garantijai**

2.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

2.1.2. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecināša dokumenta kopija);

2.1.3. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

2.1.4. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt galvojumu apdrošināšanu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas,


dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);  
2.1.5. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.

**2.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:**

- 2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
- 2.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
- 2.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
- 2.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 2.2.5. kredītiestādes izsniegtai garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Pasūtītājs  
VAS "Latvijas Valsts ceļi"  
valdes priekšsēdētājs  
J.Lange

valdes loceklis  
E.Strods



Izpildītājs  
CBF SIA "Binders"  
valdes priekšsēdētājs  
A.Sēja

valdes loceklis  
I.Pētersons

